

INFORME No. 04 DE RENDICIÓN DE CUENTAS OCAD REGIÓN PACÍFICO

Período comprendido
(Julio 1° de 2016 a Diciembre 31 de 2016)

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN


| GOBIERNO NACIONAL | | |
|---|------------------------------------|--|
| ENTIDAD | NOMBRE | CORREO |
| Ministerio de Hacienda | Mauricio Cárdenas Santamaría | mcardenas@minhacienda.gov.co |
| Ministerio de Vivienda | Elsa Noguera De la Espriella | correspondencia@minvivienda.gov.co |
| Ministerio de Transporte | Jorge Eduardo Rojas Giraldo | mt@mintransporte.gov.co |
| Ministerio de Ambiente | Luis Gilberto Murillo Urrutia | igmurillo@minambiente.gov.co |
| Planeación Nacional | Simón Gaviria Muñoz | sgaviria@dn.gov.co |
| GOBERNADORES | | |
| Departamento de Cauca | Oscar Rodrigo Campo Hurtado | gobernador@cauca.gov.co ; sarbelaez@cauca.gov.co |
| Departamento de Chocó | Giovanny Alberto Palacios Mosquera | domitilo1969@yahoo.es |
| Departamento de Nariño | Camilo Romero Galeano | camiloromero@narino.gov.co |
| Departamento del Valle del Cauca | Dilian Francisca Toro Torres | dftoro@valledelcauca.gov.co |
| ALCALDES | | |
| Municipio de Caldono - Cauca | Paulo Andrés Piso Lozada | paulopi6@hotmail.com ; alcaldia@caldono-cauca.gov.co |
| Municipio - Santa Rosa-Cauca | Jaime Alberto Urrutia Joaqui | jaimealbertourrutia@gmail.com |
| Municipio de Popayán- Cauca | César Cristian Gómez Castro | cesarcristiangomez@hotmail.com |
| Municipio Bajo Baudó - Chocó | Jhon Jared Murillo Ramírez | jjared3@hotmail.com ; juliethcordoba_91@hotmail.com ; |
| Municipio de Rio Sucio- Chocó | Luis Enrique Mena Rentería | menacontador@yahoo.es ; segobernar@hotmail.com |
| Municipio de Guachucal-Nariño | Ana Lucía Inampues Toro | alcaldia@guachucal-narino.gov.co ; analuciainampuest@hotmail.com |
| Municipio de El Rosario-Nariño | Erwin Yonsy Montoya Córdoba | heloom@hotmail.com |
| Municipio de El Dovio- Valle del Cauca | Rodolfo Vidal Astaíza | alcaldia@eldovio-valle.gov.co ; rodolfovidal.a@gmail.com |
| Municipio de Versalles -Valle del Cauca | Diego Fernando Mejía Millán | diegofer030965@gmail.com |



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 7

| SECRETARIOS DE PLANEACIÓN | | |
|--|---------------------------------|--|
| ENTIDAD | NOMBRE | CORREO |
| Cauca | Jimena Velasco | splaneacion@cauca.gov.co |
| Chocó | Everth Jesús Rodríguez | everth1rd@hotmail.es ; splaneacion.gobchoco@gmail.com |
| Nariño | Mario Alejandro Viteri Palacios | marioviteri@narino.gov.co ; marioviteri@narino.gov.co |
| Valle del Cauca | Roy Alejandro Barreras | barrerasroy@gmail.com ; rabarreras@valledelcauca.gov.co |
| INVITADOS PERMANENTES | | |
| ENTIDAD | NOMBRE | CORREO |
| Senador de la República | Guillermo García Realpe | guillergarcia@hotmail.com |
| Senador de la República | Myriam Alicia Paredes Aguirre | mapa520@hotmail.com |
| Representante a la Cámara | Diela Liliana Benavides Solarte | sequeda@yahoo.com |
| Representante a la Cámara | Oscar Fernando Bravo Realpe | - |
| Representante a la Cámara | Berner León Zambrano Erazo | bernerzambrano@yahoo.com |
| Directora de Comunidades Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | Pedro Santiago Posada Arango | pedro.posada@mininterior.gov.co |
| Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías | Pedro Santiago Posada Arango | pedro.posada@mininterior.gov.co |
| ENLACES | | |
| Cauca - Enlace | Diana Marcela Narvaez | enlacecaucasgr@gmail.com |
| Chocó - Enlace | Diana Marcela Rodriguez | dianamaregalias@gmail.com |
| Chocó - Profesional SGR | Yineida Moreno | gryimopa02@hotmail.com |
| Nariño | Heidy Eliana Diaz Gamboa | enlacenarinosgr@gmail.com |
| Valle del Cauca | Isabel Cristina Torres | isabelregalias@gmail.com |
| DNP Coordinador Grupo SGR | Camilo Lloreda Becerra | clloreda@dnps.gov.co |
| DNP Enlace Pacífico | Ana Matilde Juvinao Carbonó | ajuvinao@dnps.gov.co |
| Min Hacienda- Coordinadora SGR | Angélica Leguizamo | aleguiza@minhacienda.gov.co |
| Min Hacienda- Enlace Pacífico | Patricia Andrade Morantes | pmorantes@minhacienda.gov.co |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

| SECRETARÍA TÉCNICA | | |
|---|--------------------------------|--|
| ENTIDAD | NOMBRE | CORREO |
| Secretario Técnico | Roy Alejandro Barreras Cortes | rabarreras@valledelcauca |
| Subsecretario | Juan Manuel Mejía Henao | jmmejia@valledelcauca.gov.co |
| Líder Administrativa | Lina Maria Otero González | regaliaslina@gmail.com |
| Líder Operativo | Oscar Villani Romero | oscarvillani@hotmail.com |
| Líder Financiero | Heyler Amancio Cuesta Mosquera | heylerstocadpacifico@gmail.com |
| Líder SUIFP | Jairo Alonso Lemos Garcia | regaliasjairo@gmail.com |
| Líder Verificación Requisitos Ejecución | Carlos Heder Chávez Narváez | chavezregalias@yahoo.com |
| Líder de Archivo y Logística | Gustavo Andrés Ossa Flores | regaliasgustavo@gmail.com |

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

| No. | Nombre Completo | Entidad a la que representa |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. | ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTES | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA |

OCAD REGION PACIFICO



Siguiendo lo establecido en los términos del artículo 2.2.4.3.2.4 del Decreto 1082 y el acuerdo 036 de 2016 expedido por la Comisión Rectora del SGR, el cual indica que el informe de gestión de los OCAD deberá ser publicado por la Secretaría Técnica dentro de los 30 días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre en la plataforma integrada de información del Sistema General de Regalías (Mapa regalías).

La información que se derive del OCAD debe comunicarse en función del cumplimiento del marco legal que establecen los Artículos 58 y 71 de la Ley 1530 de 2012, relacionados con la publicidad, la transparencia y la participación ciudadana en el Sistema General de Regalías. Esto permite poner en conocimiento de los ciudadanos, de manera oportuna y

veraz, la gestión y las decisiones del OCAD Región Pacífico, para garantizar al acceso a la información y contribuyendo al proceso de generación de opinión pública y control social.

INTRODUCCION

El presente informe de rendición de cuentas de la vigencia comprendida entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2016, se rinde para dar cumplimiento al Acuerdo 033 expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. La información que se derive del OCAD debe comunicarse en función del cumplimiento del marco legal que establecen los Artículos 58 y 71 de la Ley 1530 de 2012, relacionados con la publicidad, la transparencia y la participación ciudadana en el Sistema General de Regalías. Esto permite poner en conocimiento de los ciudadanos, de manera oportuna y veraz, la gestión y las decisiones del OCAD Región Pacífico, para garantizar al acceso a la información y contribuyendo al proceso de generación de opinión pública y control social.

En el segundo semestre del 2016, el OCAD Regional aprobó 20 proyectos por valor de \$ 169.826.737.799, de los cuales corresponden a: Transporte el 32%; Salud 23% Educación el 16%, Agricultura 9%, Otros Sectores 4%; TIC's 9%; Deporte y Recreación 7%.

El Departamento del Cauca logro en este periodo aprobar 4 proyectos por valor de \$60.717.598.629, 11 vigencias futuras aprobadas, 4 cierre de proyectos y 9 ajustes siguiendo lo establecido en el Acuerdo 020 y Acuerdo 037 expedidos por la Comisión Rectora del SGR.

El Departamento del Chocó logró en esta vigencia aprobar 5 proyectos por valor de \$31.310.666.863, 5 vigencias futuras aprobadas y 3 ajustes siguiendo lo establecido en el Acuerdo 020 y Acuerdo 037 expedidos por la Comisión Rectora del SGR.

El Departamento de Nariño logro en esta vigencia aprobar 1 proyecto por valor de \$7.727.719.961, 5 vigencias futuras de ejecución aprobadas, 1 cierre de proyectos y 5 ajustes siguiendo lo establecido en el Acuerdo 020 y Acuerdo 037 expedidos por la Comisión Rectora del SGR.

El Departamento del Valle del Cauca logro en esta vigencia aprobar 10 proyectos por valor de \$70.070.752.346, 14 vigencias futuras de ejecución aprobadas e informo al OCAD 3 cierres de proyectos.

En esta vigencia no hubo solicitud de prorrogas para dar cumplimiento a los requisitos previos a la etapa contractual para ningún proyecto de inversión.



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 7

Los acuerdos que sustentan esta información se encuentran disponibles en la página Web de la Gobernación del Valle: Acuerdo 40 de agosto 19; acuerdo 041 de septiembre 8; acuerdo 045 de Noviembre 9 y acuerdo 046 de Diciembre 19 de 2016, han sido debidamente notificados y comunicados a los interesados:

<http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=31927>

OBJETIVO

Dar a conocer a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, los resultados de la gestión pública con relación a los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el período comprendido entre julio 1° de 2016 y diciembre 31 de 2016.

ALCANCE

Con base en los reportes de los sistemas de información del SGR, este documento presenta información detallada de los proyectos de inversión que fueron viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD Región Pacífico, los sectores beneficiados, el impacto y la pertinencia, así como las asignaciones y saldos correspondientes a los departamentos de Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca, que conforman la Región Pacífico, con la finalidad de promover el desarrollo integral de la región, en el segundo semestre del año en curso, período comprendido entre julio 1° de 2016 y diciembre 31 del 2016.

DIVULGACION

La estrategia de comunicación establecida para la divulgación del presente informe según lo acordado con los miembros del OCAD, es a través de las páginas web de las 4 gobernaciones que integran el OCAD Región Pacífico: Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca.

Con el fin de dar más cobertura en la divulgación hacia la comunidad, adicionalmente se registrará en el aplicativo MAPA REGALÍAS del DNP.

Posteriormente y con el fin de ser más efectivo con la comunicación se enviarán a los jefes de prensa de los 4 departamentos para que se envíe el informe a los medios de comunicación de los departamentos de la Región y la comunidad pueda acceder a la información garantizando la transparencia en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías. Además se entregará un CD del informe en el próximo OCAD de la Región Pacífico.



PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

| ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012-2016 JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016 REGIÓN PACIFICO | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| ITEM | DETALLE | Fondo de Compensación Regional 60% | Fondo de Desarrollo Regional | Total |
| 1 | Apropiación Ajustada 2012(Dcreto 1399 de 2013) | 157.009.678.946 | 155.703.900.990 | 312.713.579.936 |
| 2 | Apropiación Ajustada 2013-2014(Recaudo neto 2013-2014+ Mayor recaudo 2012 que financia menor recaudo 2013-2014) | 417.237.720.344 | 416.018.801.147 | 833.256.521.491 |
| 3 | Asignaciones presupuestal 50% Ley 1744 de 2015 con Aplazamiento del Decreto 1450 de 2015 | 168.754.867.346 | 167.425.459.228 | 336.180.326.574 |
| 4 | Saldo de Mayor recaudo 2012(Disponibilidad 2015) | 26.606.277.170 | - | 26.606.277.170 |
| 5 | Compensación 2014(Decreto 1490/2015) | - | 22.205.365.419 | 22.205.365.419 |
| 6 | TOTAL ASIGNACIONES 2012-2015 | 769.608.543.806 | 761.353.526.784 | 1.530.962.070.590 |
| 7 | Aprobaciones 2012-2015 | 712.703.847.313 | 681.315.976.079 | 1.394.019.823.392 |
| 8 | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (6-7) | 56.904.696.493 | 80.037.550.705 | 136.942.247.198 |
| 9 | Asignaciones presupuestal 50% Ley 1744 de 2015 con Aplazamiento del Decreto 1450 de 2015 | 168.754.867.346 | 167.425.459.228 | 336.180.326.574 |
| 10 | Aprobaciones Enero a Junio 30 de 2016 | | | - |
| 11 | SALDO INICIAL A JULIO 01 DE 2016 (8+9-10) | 225.659.563.839 | 247.463.009.933 | 473.122.573.772 |
| 12 | Aprobaciones Julio 01 a Diciembre 31 de 2016 | 71.946.534.523 | 89.298.829.151 | 161.245.363.674 |
| 13 | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (11-12) | 153.713.029.316 | 158.164.180.782 | 311.877.210.098 |
| | PORCENTAJE DE APROBACIONES II SEMESTRE DE 2016 | 31,88% | 36.09% | 34.08% |

PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE:
RECURSOS APROBADOS POR SECTORES

PERIODO JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

**ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012-2016
JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016**

| SECTOR | CAUCA | CHOCÓ | NARIÑO | VALLE | TOTAL | % |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| TRANSPORTE | 17.825.326.369 | 26.226.237.646 | 1.752.053.334 | 21.310.919.885 | 67.114.537.234 | 41.6% |
| EDUCACION | 3.300.000.000 | | | 10.640.321.066 | 13.940.321.066 | 8.6% |
| DEPORTE Y RECREACION | 4.628.754.124 | | | 12.251.256.735 | 16.880.010.859 | 10.5% |
| AGRICULTURA | 1.446.068.931 | 10.423.715.243 | | 3.411.860.400 | 15.281.644.574 | 9.5% |
| SALUD | 13.390.321.151 | 3.746.347.400 | 1.552.902.764 | | 18.689.571.315 | 11.6% |
| VIVIENDA | | | 132.351.165 | | 132.351.165 | 0.1% |
| EDUCACION | | | 7.727.719.961 | | 7.727.719.961 | 4.8% |
| OTROS SECTORES | | | | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 3.7% |
| TICS | | | | 15.478.907.500 | 15.478.907.500 | 9.6% |
| TOTAL | 40.590.770.575 | 40.396.300.289 | 11.165.027.224 | 69.093.265.586 | 161.245.063.674 | 100.0% |

DEPARTAMENTO DE CAUCA



ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012-2016
JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016
CAUCA

| ITEM | DETALLE | Fondo de Compensación Regional 60% | Fondo de Desarrollo Regional | Total |
|------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Apropiación Ajustada 2012(Decreto 1399 de 2013 | 46.353.610.481 | 36.415.197.725 | 82.768.808.206 |
| 2 | Apropiación Ajustada 2013-2014(Recaudo neto 2013-2014+ Mayor recaudo 2012 que financia menor recaudo 2013-2014 | 124.555.401.500 | 99.450.051.625 | 224.005.453.125 |
| 3 | Asignaciones presupuestal 50% Ley 1744 de 2015 con Aplazamiento del Decreto 1450 de 2015 | 50.241.791.916 | 40.723.748.919 | 90.965.540.835 |
| 4 | Saldo de Mayor recaudo 2012(Disponibilidad 2015) | 7.854.910.707 | | 7.854.910.707 |
| 5 | Compensación 2014(Decreto 1490/2015) | | 8.238.242.152 | |
| 6 | TOTAL ASIGNACIONES 2012-2015 | 229.005.714.604 | 184.827.240.421 | 405.594.712.873 |
| 7 | Aprobaciones 2012-2015 | 194.606.354.527 | 159.225.850.540 | 353.832.205.067 |
| 8 | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (6-7) | 34.399.360.077 | 25.601.389.881 | 60.000.749.958 |
| 9 | Asignaciones presupuestal 50% Ley 1744 de 2015 con Aplazamiento del Decreto 1450 de 2015 | 50.241.791.916 | 40.723.748.919 | 90.965.540.835 |
| 10 | Aprobaciones Enero 01 a Junio 30 de 2016 | | | - |
| 11 | SALDO INICIAL A JULIO 01 DE 2016 (8+9-10) | 84.641.151.993 | 66.325.138.800 | 150.966.290.793 |
| 12 | Aprobaciones Julio 01 a Diciembre 31 de 2016 | 29.838.286.392 | 10.752.484.183 | 40.590.770.575 |
| 13 | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (11-12) | 54.802.865.601 | 55.572.654.617 | 110.375.520.218 |
| | PORCENTAJE DE APROBACIONES II SEMESTRE DE 2016 | 35.25% | 16.21% | 26.89% |

NOTA: AL TOTAL DE APROBACIONES 2012-2015 SE LE SUMARON LOS \$ 8,980,784,740 FCR60%, DE REINTEGROS DE OTRAS VIGENCIAS QUE NO LIBERAN CUPO PPTAL EN ESTA VIGENCIA

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ



ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012-2016
JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016
CHOCÓ

| ITEM | DETALLE | Fondo de Compensación Regional 60% | Fondo de Desarrollo Regional | Total |
|------|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Apropiacion Ajustada 2012(Dcreto 1399 de 2013) | 39.912.799.764 | 24.310.010.273 | 64.222.810.037 |
| 2 | Apropiacion Ajustada 2013-2014(Recaudo neto 2013-2014+ Mayor recaudo 2012 que financia menor recaudo 2013-2014) | 108.784.636.807 | 67.533.895.929 | 176.318.532.736 |
| 3 | Asignaciones presupuestal 50% Ley 1744 de 2015 con Aplazamiento del Decreto 1450 de 2015 | 44.004.342.916 | 24.125.199.275 | 68.129.542.191 |
| 4 | Saldo de Mayor recaudo 2012(Disponibilidad 2015) | 6.763.474.840 | | 6.763.474.840 |
| 5 | Compensación 2014(Decreto 1490/2015) | | | - |
| 6 | TOTAL ASIGNACIONES 2012-2015 | 199.465.254.327 | 115.969.105.477 | 315.434.359.804 |
| 7 | Aprobaciones 2012-2015 | 190.657.110.842 | 111.885.575.861 | 302.542.686.703 |
| 8 | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (6-7) | 8.808.143.485 | 4.083.529.616 | 12.891.673.101 |
| 9 | Asignaciones presupuestal 50% Ley 1744 de 2015 con Aplazamiento del Decreto 1450 de 2015 | 44.004.342.916 | 24.125.199.275 | 68.129.542.191 |
| 10 | Aprobaciones Enero a Junio 30 de 2016 | | | - |
| 11 | SALDO INICIAL A JULIO 01 DE 2016 (8+9-10) | 52.812.486.401 | 28.208.728.891 | 81.021.215.292 |
| 12 | Aprobaciones Julio 01 a Diciembre 31 de 2016 | 25.900.751.539 | 14.495.548.750 | 40.396.300.289 |
| 13 | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (11-12) | 26.911.734.862 | 13.713.180.141 | 40.624.915.003 |
| | PORCENTAJE DE APROBACIONES II SEMESTRE DE 2016 | 49.04% | 51.39% | 49.86% |

NOTA: AL TOTAL DE APROBACIONES 2012-2015 SE LE SUMARON LOS \$ 149,366,761 FCR60%, DE REINTEGROS DE OTRAS VIGENCIAS QUE NO LIBERAN CUPO PPTAL EN ESTA VIGENCIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO



**ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012-2016
JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016
NARIÑO**

| ITEM | DETALLE | Fondo de Compensación Regional 60% | Fondo de Desarrollo Regional | Total |
|------|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Apropiación Ajustada 2012(Dcreto 1399 de 2013) | 52.877.734.487 | 43.379.132.276 | 96.256.866.763 |
| 2 | Apropiación Ajustada 2013-2014(Recaudo neto 2013-2014+ Mayor recaudo 2012 que financia menor recaudo 2013-2014) | 135.915.244.090 | 111.193.445.746 | 247.108.689.836 |
| 3 | Asignaciones presupuestal 50% Ley 1744 de 2015 con Aplazamiento del Decreto 1450 de 2015 | 54.906.134.404 | 46.122.957.291 | 101.029.091.695 |
| 4 | Saldo de Mayor recaudo 2012(Disponibilidad 2015) | 8.960.464.535 | | 8.960.464.535 |
| 5 | Compensación 2014(Dcreto 1490/2015) | | 5.325.709.798 | 5.325.709.798 |
| 6 | TOTAL ASIGNACIONES 2012-2015 | 252.659.577.516 | 206.021.245.111 | 458.680.822.627 |
| 7 | Aprobaciones 2012-2015 | 253.477.063.200 | 185.728.215.502 | 439.205.278.702 |
| 8 | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (6-7) | - 817.485.684 | 20.293.029.609 | 19.475.543.925 |
| 9 | Asignaciones presupuestal 50% Ley 1744 de 2015 con Aplazamiento del Decreto 1450 de 2015 | 54.906.134.404 | 46.122.957.291 | 101.029.091.695 |
| 10 | Aprobaciones Enero a Junio 30 de 2016 | | | - |
| 11 | SALDO INICIAL A JULIO 01 DE 2016 (8+9-10) | 54.088.648.720 | 66.415.986.900 | 120.504.635.620 |
| 12 | Aprobaciones Julio 01 a Diciembre 31 de 2016 | 3.437.307.263 | 7.727.719.961 | 11.165.027.224 |
| 13 | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (11-12) | 50.651.341.457 | 58.688.266.939 | 109.339.608.396 |
| | PORCENTAJE DE APROBACIONES II SEMESTRE DE 2016 | 6.35% | 11.64% | 9.27% |

NOTA: AL TOTAL DE APROBACIONES 2012-2015 SE LE SUMARON LOS \$ 4.045.557.882 FCR60% Y 529.600.000 FDR, DE REINTEGROS DE OTRAS VIGENCIAS QUE NO LIBERAN CUPO PPTAL EN ESTA VIGENCIA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA




ASIGNACIONES Y APROBACIONES 2012-2016
JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016
VALLE DEL CAUCA

| ITEM | DETALLE | Fondo de Compensación Regional 60% | Fondo de Desarrollo Regional | Total |
|------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Apropiación Ajustada 2012(Dcreto 1399 de 2013 | 17.865.534.214 | 51.599.560.716 | 69.465.094.930 |
| 2 | Apropiación Ajustada 2013-2014(Recaudo neto 2013-2014+ Mayor recaudo 2012 que financia menor recaudo 2013-2014 | 47.982.437.947 | 137.841.407.847 | 185.823.845.794 |
| 3 | Asignaciones presupuestal 50% Ley 1744 de 2015 con Aplazamiento del Decreto 1450 de 2015 | 19.602.598.110 | 56.453.553.743 | 76.056.151.853 |
| 4 | Saldo de Mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015) | 3.027.427.088 | | 3.027.427.088 |
| 5 | Compensación 2014(Decreto 1490/2015) | | 8.641.413.469 | 8.641.413.469 |
| 6 | TOTAL ASIGNACIONES 2012-2015 | 88.477.997.359 | 254.535.935.775 | 343.013.933.134 |
| 7 | Aprobaciones 2012-2015 | 73.963.318.744 | 224.476.334.176 | 298.439.652.920 |
| 8 | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (6-7) | 14.514.678.615 | 30.059.601.599 | 44.574.280.214 |
| 9 | Asignaciones presupuestal 50% Ley 1744 de 2015 con Aplazamiento del Decreto 1450 de 2015 | 19.602.598.110 | 56.453.553.743 | 76.056.151.853 |
| 10 | Aprobaciones Enero a Junio 30 de 2016 | | | - |
| 11 | SALDO INICIAL A JULIO 01 DE 2016 (8+9-10) | 34.117.276.725 | 86.513.155.342 | 120.630.432.067 |
| 12 | Aprobaciones Julio 01 a Diciembre 31 de 2016 | 12.770.189.329 | 56.323.076.257 | 69.093.265.586 |
| 13 | SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (11-12) | 21.347.087.396 | 30.190.079.085 | 51.537.166.481 |
| | PORCENTAJE DE APROBACIONES II SEMESTRE DE 2016 | 37.43% | 65.10% | 57.23% |

**CONSOLIDADO REGIÓN PACÍFICO
POR SECTORES Y POR DEPARTAMENTOS**

| SECTOR | CAUCA | CHOCO | NARIÑO | VALLE | TOTALES | % POR SECTORES |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| OTROS SECTORES | - | - | - | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 4 |
| AGRICULTURA | - | 10.581.215.243 | - | 4.389.347.160 | 14.970.562.403 | 9 |
| TRANSPORTE | 15.728.427.688 | 16.983.104.220 | - | 21.310.919.885 | 54.022.451.793 | 32 |
| EDUCACION | 9.300.000.000 | - | 7.727.719.961 | 10.640.321.066 | 27.668.041.027 | 16 |
| TIC'S | - | - | - | 15.478.907.500 | 15.478.907.500 | 9 |
| DEPORTE Y RECREACION | - | - | - | 12.251.256.735 | 12.251.256.735 | 7 |
| SALUD | 35.689.170.941 | 3.746.347.400 | - | - | 39.435.518.341 | 23 |
| TOTALES | 60.717.598.629 | 31.310.666.863 | 7.727.719.961 | 70.070.752.346 | 169.826.737.799 | 100 |


**CONSOLIDADO DE APROBACIÓN POR SECTOR DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN PACÍFICO**

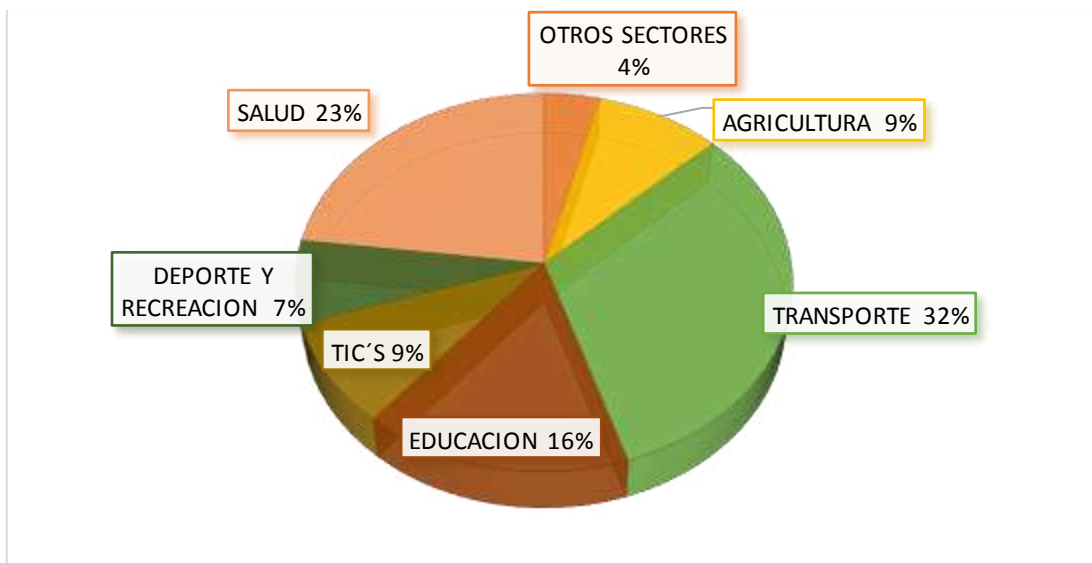

CAUCA

| SECTOR | CAUCA | % |
|----------------|-----------------------|------------|
| TRANSPORTE | 15.728.427.688 | 26 |
| EDUCACION | 9.300.000.000 | 15 |
| SALUD | 35.689.170.941 | 59 |
| TOTALES | 60.717.598.629 | 100 |


CONSOLIDADO DE APROBACIÓN POR SECTOR DE INVERSIÓN DEPARTAMENTO DEL CAUCA

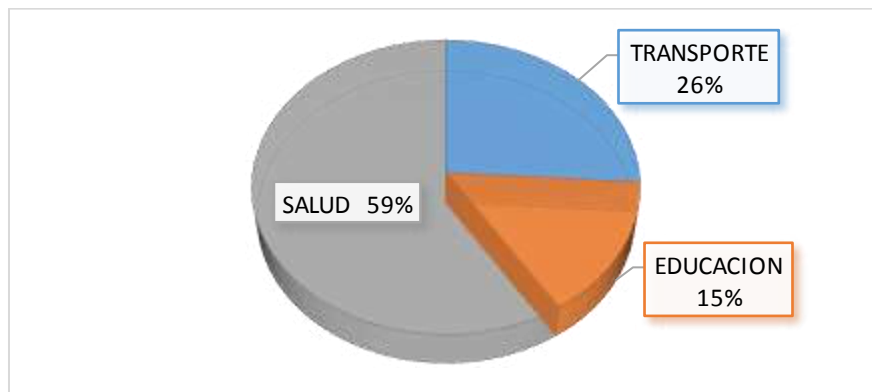

CHOCÓ

| SECTOR | CHOCÓ | % |
|----------------|-----------------------|------------|
| AGRICULTURA | 10.581.215.243 | 33 |
| TRANSPORTE | 16.983.104.220 | 55 |
| SALUD | 3.746.347.400 | 12 |
| TOTALES | 31.310.666.863 | 100 |

CONSOLIDADO DE APROBACIÓN POR SECTOR DE INVERSIÓN DEPARTAMENTO DEL CAUCA

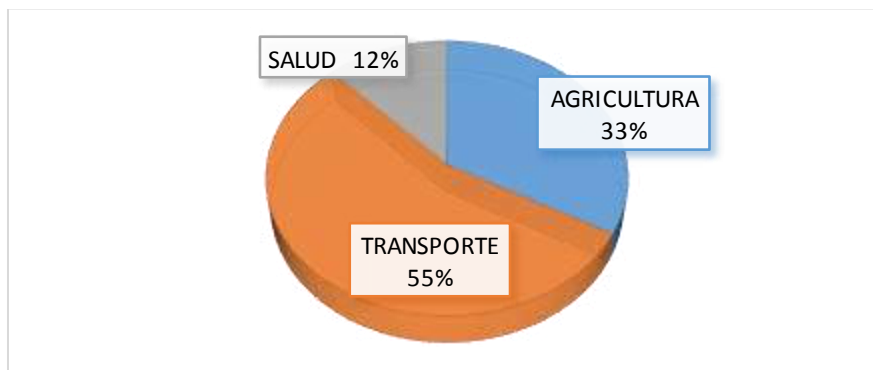


NARIÑO

| SECTOR | NARIÑO | % |
|----------------|----------------------|------------|
| EDUCACION | 7.727.719.961 | 100 |
| TOTALES | 7.727.719.961 | 100 |

VALLE DEL CAUCA

| SECTOR | VALLE | % |
|----------------------|-----------------------|------------|
| OTROS SECTORES | 6.000.000.000 | 9 |
| AGRICULTURA | 4.389.347.160 | 6 |
| TRANSPORTE | 21.310.919.885 | 30 |
| EDUCACION | 10.640.321.066 | 15 |
| TIC'S | 15.478.907.500 | 22 |
| DEPORTE Y RECREACION | 12.251.256.735 | 18 |
| TOTALES | 70.070.752.346 | 100 |

CONSOLIDADO DE APROBACIÓN POR SECTOR DE INVERSION DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

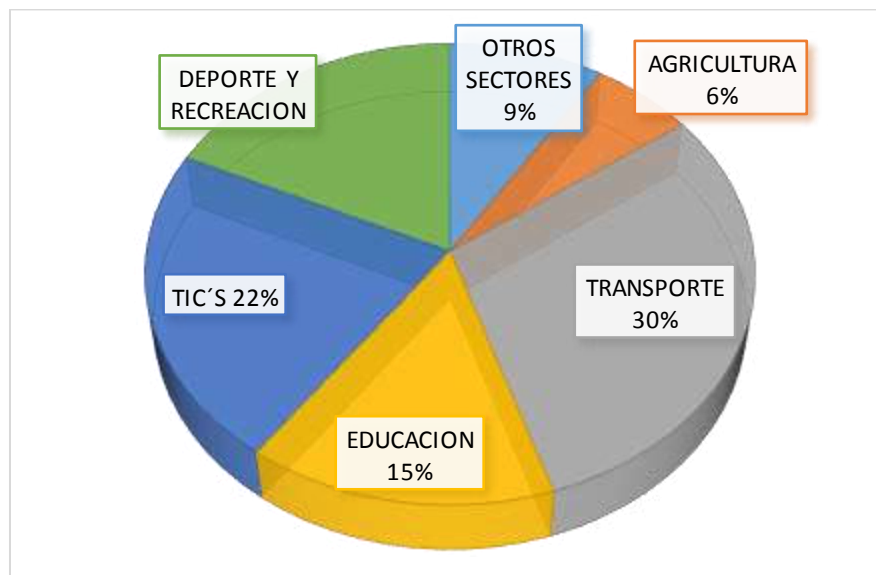



PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2016

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Proyectos aprobados en esta vigencia: 4

Proyecto 1:


| ITEM | DESCRIPCION |
|--|--|
| Nombre del Proyecto | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA, |
| Código BPIN | 2016000030015 |
| Sector | SALUD |
| Valor Total | \$35.689.170.941,00 |
| Solicitud de recursos del SGR | \$12.060.168.381 FCR |
| Otras fuentes (discriminar) | 900.000.000 PGN 10.386.533.590 PGN 3.713.466.410 PGN 1.200.000.000,00 PGN |
| Tiempo de ejecución | 22 meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 67.0 |
| Estado de ejecución Física (Gesproy) | SIN CONTRATAR (Dic 15 de 2016) |
| Estado de ejecución Financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR (Dic 15 de 2016) |



Rendición de Cuentas de los OCAD


Versión: 7

| | |
|--|---|
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 046 Diciembre 19 de 2016 |
| Impacto | <p>Plan de Desarrollo 2016 - 2019: Enfoque Territorial: Desarrollo Humano Integral, Programa: Red de Prestación de Servicios. Meta de Resultado: Optimizar en un 60% en las E.S.E las con condiciones en infraestructura y dotación para prestar un mejor servicio de salud.</p> <p>Indicador de Resultado: % de E.S.E. con condiciones en infraestructura y dotación, para prestar un mejor servicio de salud optimizado.</p> <p>Beneficiados: 403.121</p> |
| Pertinencia | <p>Permite mejorar la calidad de vida de la población objetivo, además una atención adecuada y oportuna para los municipios del norte del Departamento del Cauca.</p> |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|


Proyecto 2:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|---|
| Nombre del Proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA VÍA 12CC05 TRAMO ALMAGUER CRUCE RUTA 25CC15, MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA, OCCIDENTE |
| Código BPIN | 2016000030019 |
| Sector | Transporte |
| Valor Total | 13.119.506.231 |
| Solicitud de recursos del SGR | 13.119.506.231 FCR |
| Otras fuentes (discriminar) | No aplica |
| Tiempo de ejecución | 12 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 50.7 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | SIN CONTRATAR (Dic 15 de 2016) |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR (Dic 15 de 2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 046 de 19 de Diciembre de 2016 |
| Impacto | Cauca Territorio de Paz - 16.2.2.6. Pavimentación y mejoramiento de la red vial departamental - Beneficiarios 21286 Personas |
| Pertinencia | Se prevé que la infraestructura permitirá la expansión de las actividades económicas del Departamento y en especial de los municipios beneficiados. |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|


Proyecto 3:

| ITEM | Descripción |
|--|--|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Código BPIN | 2014000030063 |
| Sector | Educación |
| Valor Total | \$9.300.000.000 |
| Solicitud de recursos del SGR | \$3.300.000.000 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | 3.800.000.000 PGN 2.200.000.000,00 DNP |
| Tiempo de ejecución | 12 meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | UNIVERSIDAD DEL CAUCA |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 49.5 |
| Estado de ejecución Físico (Gesproy) | SIN CONTRATAR (dic 15 de 2016) |
| Estado de ejecución Financiero (Gesproy) | SIN CONTRATAR (dic 15 de 2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | ACUERDO 040 de Agosto 19 de 2016 |
| Impacto | Este proyecto cumple con el plan de Desarrollo Departamental: Territorio de Paz (2016-2019) – Territorio de paz para el buen vivir – Desarrollo humano integral - 4140 personas |
| Pertinencia | Permite aumentar el acceso de los estudiantes, mejorar las condiciones de calidad en las que se imparten los programas y apoyar la investigación, al contar con espacios óptimos para su Desarrollo. |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Proyecto 4:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|---|
| Nombre del Proyecto | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE LA VÍA FLORENCIA - CAUCA A SAN PABLO NARIÑO SECTOR FLORENCIA LÍMITES CON L DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAUCA, OCCIDENTE |
| Código BPIN | 2016000030020 |
| Sector | Transporte |
| Valor Total | 2.608.921.457 |
| Solicitud de recursos del SGR | 2.608.921.457 FCR |
| Otras fuentes (discriminar) | No aplica |
| Tiempo de ejecución | 7 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 43.1 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | SIN CONTRATAR (Dic 15 de 2016) |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR (Dic 15 de 2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 046 de 19 de Diciembre de 2016 |
| Impacto | Cauca Territorio de Paz - 16.2.2.6. Pavimentación y mejoramiento de la red vial departamental. Número de beneficiarios: 23.548 |
| Pertinencia | Se prevé que la infraestructura permitirá la expansión de las actividades económicas del Departamento y en especial de los municipios beneficiados |


| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Proyectos aprobados en esta vigencia: 5

Proyecto 1:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|---|
| Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL PLATANO PARA 278 PRODUCTORES EN MARCO DEL CONTRATO PLAN ATRATO, GRAN DARIEN, CHOCO, OCCIDENTE |
| Código BPIN | 2014000030046 |
| Sector | Agricultura |
| Valor Total | 1.253.009.662 |
| Solicitud de recursos del SGR | 1.253.009.662 FCR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 12 meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Departamento del Chocó |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | Departamento del Chocó |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 46,8 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | Contratado en Ejecución 0% (dic 15-2016) |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | Contratado en Ejecución 0% (dic 15-2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 040 del 19 de Agosto de 2016 |
| Impacto | El proyecto se ejecutara en el Depto. del Chocó, en marco del CPAGD, donde se realizara el Mejoramiento de la productividad en el cultivo de plátano para 278 pequeños productores en el que se establecerán igual número de hectáreas una por cada productor, a través de un modelo de intervención integral a la familia platanera, distribuidos así: 1) Bojayá 30 Has entre las veredas: La Loma y Piedra Candela. 2) Riosucio 162 Has entre las veredas: Balastera, La Punta, Puerto Rivas, Cetino, El 10, Playa Roja, San Andrés, Campo Alegre, Aguas Vivas, Santa María, Caño Seco, |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

| | |
|--------------------|--|
| | <p>Florida, Puerto Cesar, La Pala, La 70, Las Brisas ,Antasales, Salaquito, Llano Rico y 7 de Agosto. 3) Carmen del Darién 68 Has entre las veredas: Camelia, Caño Cloro, La Iguana, Cetino, Nevera, Brisas, El Guamo, Anda Lucia, No Hay Como Dios, Palmado, Despensa Baja, Despensa Media, Pedroza, Apartado Buenaventura, Chicao, Chitando Medio, Domingodo, La Madre, Manuel Santo y Urama. 4) Ungía 18 Has entre las veredas: Ipeti, Cuqueminas, Marcelia y Cutioquelo, para un total de 278 Hectáreas.</p> |
| Pertinencia | <p>Es pertinente con el Plan de Desarrollo del Departamento del Chocó, este proyecto se encuentra y va acorde con el plan de Desarrollo Departamental " Unidos Construyendo Desarrollo" el proyecto fortalece la competitividad de los pequeños productores plataneros mediante el mejoramiento de sus cultivos, procesos de producción sostenibles, mejores prácticas, en los Municipio de Bojaya, Riosucio, Carmen del Darién y Ungía.</p> |

Proyecto 2:


| ITEM | DESCRIPCION |
|--|---|
| Nombre del Proyecto | DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CÉRTEGUI, RIO IRO, MEDIO BAUDÓ Y UNIÓN PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, OCCIDENTE |
| Código BPIN | 2015000030037 |
| Sector | SALUD |
| Valor Total | 3.746.347.400 |
| Solicitud de recursos del SGR | 3.746.347.400 FCR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 3 meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Departamento del Chocó |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | Departamento del Chocó |



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 7

| | |
|---|---|
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 48.5 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | Sin Contratar (dic 15 de 2016) |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | Sin Contratar (dic 15 de 2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 045 Noviembre 9 de 2016 |
| Impacto | <p>El Proyecto realizara la Dotación de 5 Centro de Salud, la Administración Departamental a través de los Recursos del Sistema General de Regalías realizaron la construcción de una infraestructura de Salud a los municipios de Atrato, Cértégui, Medio Baudó, Río Iró y Unión Panamericana, para poder habilitar los servicios de estas nuevas construcciones se lleva a cabo este proyecto de Dotación, el cual va a beneficiar a 82.457 habitantes de los municipios Atrato 31.663 habitante; Certegui 12.017 habitantes; Rio Iró 11.663 habitantes; medio Baudó 15.552 habitantes y Unión Panamerica 11.562 habitantes.</p> <p>Con este proyecto se habilitaran los siguientes servicios: Consulta Externa, Urgencias, Casa Médica, Servicios Generales e Imágenes Diagnóstica, mejorando y permitiendo más acceso a los habitantes de la región con los servicios de Salud.</p> |
| Pertinencia | <p>Es pertinente con el plan de desarrollo del Departamento del Chocó, este proyecto se encuentra y va acorde con el plan de Desarrollo Departamental Sectorial" Salud como Derecho de todas las Subregiones" El proyecto contribuye en la adecuación y Mejora de la infraestructura de los 5 Centros de salud de las regiones garantizando que los habitantes puedan tener mejor calidad de vida.</p> |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Proyecto 3:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|--|
| Nombre del Proyecto | IMPLEMENTACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN, RIOSUCIO, UNGUÍA, Y ACANDI, CHOCÓ, OCCIDENTE. |
| Código BPIN | 2016000030022 |
| Sector | AGRICULTURA |
| Valor Total | 6.999.441.400 |
| Solicitud de recursos del SGR | 6.841.941.400 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | Concejo Comunitarios de Comunidades Negras: 1. Del Río Curbaradó 2. De Pedeguita 3. De Mancilla 4. Mayor del Bajo Atrato 5. De los Rios Acandí \$157.500.000 |
| Tiempo de ejecución | 6 Meses de Ejecución |
| Entidad pública designada como ejecutora | Departamento del Chocó |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | Departamento del Chocó |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 66.2 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | Sin Contratar (dic 15 de 2016) |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | Sin Contratar (dic 15 de 2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 045de Noviembre 9 de 2016 |
| Impacto | En el desarrollo del proyecto se establecerán UFP, las que tendrán un modelo dirigido a las familias para una mejor seguridad alimentaria de las 350 familias, y generar excedentes contribuyendo a mejorar sus niveles de vida. En este proyecto se ejecutaran siguientes actividades:- Cultivo asociado de Plátano - Aguacate (donde se establecerán 175 Has, 350 parcelas de 0,5 Ha-Cultivo asociado de Yuca - Aguacate (se establecerán 175 Has, 350 parcelas de 0,5 Ha- Cultivo asociado de Maíz - Aguacate (se establecerán 175 Has, 350 parcelas de 0,5 Ha)-Cultivo de Aguacate (se sembraran 1,5 Has, 3 parcelas asociadas con plátano, maíz y |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>yuca)-Cultivo de Azoteas (se construirán en cada unidad productiva familiar con 3 azoteas de 1 x 3 metros, en total se construirán 1.050 azoteas) - Cría de Gallinas Ponedoras. Todo lo antes mencionado se llevará a cabo para lograr implementar unidades productivas que garantice la generación el acceso y disponibilidad a alimentos básicos a través del fomento de producción limpia de los cultivos que apunten a la seguridad alimentaria de la Región.</p> |
| <p>Pertinencia</p> | <p>Es pertinente con el plan de Desarrollo del Departamento del Chocó, este proyecto se encuentra y va acorde con el plan de Desarrollo Departamental Sectorial "Soberanía, Autonomía y Seguridad Alimentaria y Nutricional" el proyecto promueve la producción de proteína vegetal y animal para 350 familias de las zona rurales de los municipios de Carmen del Darién, Riosucio, Ungía y Acandí, Chocó. Fortaleciendo así el sector agrícola de estas regiones.</p> |

Proyecto 4:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|--|
| Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO ISTMINA, CHOCÓ, OCCIDENTE |
| Código BPIN | 2015000030069 |
| Sector | AGRICULTURA |
| Valor Total | 2.328.764.181 |
| Solicitud de recursos del SGR | 2.328.764.181 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 4 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Departamento del Chocó |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | Departamento del Chocó |



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 7

| | |
|---|--|
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 42.1 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | Sin Contratar (Dic 15 de 2016) |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | Sin Contratar (Dic 15 de 2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 046 de Diciembre 19 de 2016 |
| Impacto | <p>El proyecto se lleva a cabo con el fin de realizar adecuación y mejoramiento de (1719,393)m" de la plaza de mercado de Istmina, dentro de las acciones a realizar en este proyecto están:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Localización y replanteo - Intervenciones en los cimientos - Muros en mampostería - Cubiertas y pisos - Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas - Carpinterías metálicas y pintura <p>Esta Plaza es considerada como el principal centro de abastecimiento y comercialización de la región agrícolas en la Subregión del San Juan, con la adecuación de esta instalaciones beneficiaran a 25351 habitantes minimizando así riesgos que puedan atentar con la salud de los habitantes;</p> |
| Pertinencia | <p>Es pertinente con el plan de Desarrollo del Departamento del Chocó, este proyecto se encuentra y va acorde con el plan de Desarrollo Departamental Sectorial" Productividad y Autoabastecimiento sostenible, como generadores de empleo" el proyecto contribuye en Mejorar las actividades comerciales en la plaza de mercado del Municipio de Istmina Chocó, y generar empleo y mejor calidad de vida a los habitantes de la región.</p> |

Proyecto 5:

| ITEM | DESCRIPCION |
|---------------------|---|
| Nombre del proyecto | FORTALECIMIENTO SOCIOECONOMICO REGIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN DEPARTAMENTAL VIA ISTMINA - PIE DE PEPE (MEDIO BAUDO) PR 5+00 AL PR 10+00 |




Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 7

| | |
|--|--|
| Código BPIN | 2016000030024 |
| Sector | TRANSPORTE |
| Valor Total | 16.983.104.220 |
| Solicitud de recursos del SGR | 16.983.104.220 FCR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 14 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 67 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | Sin Contratar (Dic 15 de 2016) |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | Sin Contratar (Dic 15 de 2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 046 de Diciembre 19 de 2016 |
| Impacto | El proyecto beneficiará a 117502 habitantes de la región, Mejorando el estado de la vía Istmina - Pie de Pepe (Medio Baudó). Con la ejecución de este proyecto se generará desarrollo y aumentará los índices de calidad de vida de la población, contribuyendo notablemente en mejorar las condiciones de tránsito (viales) y de seguridad de la Región. |
| Pertinencia | Es pertinente con el plan de Desarrollo del Departamento del Chocó, este proyecto se encuentra y va acorde con el plan de Desarrollo Departamental Sectorial "Apoyo a la infraestructura vial y de transporte e integración regional con infraestructura intermodal" el proyecto contribuye en el desarrollo de las condiciones de la infraestructura vial para fortalecer el sector socioeconómico. |

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Proyectos aprobados en esta vigencia: 1

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Proyecto 1:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|--|
| Nombre del proyecto | FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVES DEL SUMINISTRO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO, EN EL DEPARTAMENTO NARIÑO. |
| Código BPIN | 2016000030017 |
| Sector | EDUCACIÓN |
| Valor Total | 7.727.719.961 |
| Solicitud de recursos del SGR | 7.727.719.961 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 49 días |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 59,5 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | SIN CONTRATAR (15/12/2016) |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR (15/12/2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 045 del 09 de octubre de 2016 |
| Impacto | Este proyecto contribuye al acceso con permanencia escolar de los (134.257 estudiantes) niños, niñas, adolescentes y jóvenes, focalizados, registrados en la matrícula oficial (SIMAT), fomentando hábitos alimentarios saludables, a través del suministro de 6.871.074 raciones alimentarias, en 1.643 establecimientos educativos de los 61 municipios no certificados del departamento de Nariño. Así mismo este proyecto aporta al cumplimiento de metas a nivel nacional en uno de los tres pilares "Colombia la más Educada" del Plan de Desarrollo 2014 - 2018 "Todos por un Nuevo País", ya que dentro de los postulados del Plan de Desarrollo 2016-2019 "NARIÑO CORAZON DEL MUNDO", en el eje temático EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, programa Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, se estableció una meta de resultados |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>que textualmente expresa: “Garantizado el acceso al programa de Alimentación Escolar en las 13 subregiones del Departamento”. De esta meta de resultado, se desprenden dos metas de producto: “Implementado el programa de alimentación escolar”, y la otra, “constituido y operado comité de seguimiento a la ejecución del Plan de Alimentación Escolar PAE”.</p> |
| <p>Pertinencia</p> | <p>Es pertinente con el plan de desarrollo del Departamento Nariño, este proyecto se encuentra dentro del Eje Equidad e Inclusión, Programa Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. El proyecto contribuye a garantizar la cobertura de estudiantes de los establecimientos educativos beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar durante el calendario académico. Una de las respuestas para fomentar la permanencia desde el nivel nacional es el Programa de Alimentación Escolar - PAE, estrategia nacional para la cual no son suficientes los recursos asignados desde el presupuesto general de la nación, en este sentido las regalías son una fuente alternativa de recursos para extender este programa que ha tenido excelentes resultados.</p> |

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Proyectos aprobados en esta vigencia: 10

Proyecto 1:

| ITEM | DESCRIPCION |
|-------------------------------|---|
| Nombre del proyecto | ACTUALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL VALLE DEL CAUCA |
| Código BPIN | 2015000030034 |
| Sector | OTROS SECTORES |
| Valor Total | 6.000.000.000 |
| Solicitud de recursos del SGR | 6.000.000.000 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 10 meses |



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 7

| | |
|--|---|
| Entidad pública designada como ejecutora | IMPRENTA DEPARTAMENTAL |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | GOBERNACION DEL VALLE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 50.5 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | En Contratación (dic 15 de 2016) |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | En Contratación (dic 15 de 2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 40 de agosto 19 de 2016 |
| Impacto | <p>Contar con un sistema articulado de gestión documental, facilitará los procesos de producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación, disposición final de los documentos y la implementación de nuevas tecnologías, para contribuir a una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz tanto en los procesos internos de cada una de las administraciones como en la colaboración necesaria que debe darse entre entidades territoriales permitiendo al ciudadano vallecaucano contar con sistemas de atención integrados que faciliten su acercamiento a la administración y a las entidades del Valle del Cauca, atender con mayor celeridad los requerimientos internos y externos que puede llevarlo a convertirse en ejemplo de gestión en el país.</p> |
| Pertinencia | <p>El proyecto es pertinente, conveniente y oportuno porque con este proyecto se busca mejorar las condiciones de gobernabilidad del departamento del Valle del Cauca y sus municipios, generando efectividad en sus procesos y un mejor aprovechamiento de sus recursos existentes ya que al presentarse organizados en atención a lo requerido en la Ley, y contar con procesos de capacitación uniformes para los funcionarios de todas las entidades territoriales participantes, se facilitará la integración en una mejor gestión pública.</p> |


Proyecto 2:



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 7


| ITEM | DESCRIPCION |
|--|---|
| Nombre del Proyecto | IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS ACUÍCOLAS EN EL CULTIVO DE LAS ESPECIES TILAPIA ROJA OREOCHROMIS SP Y TRUCHA ARCO IRIS ONCORHYNCHUS MYKISS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. |
| Código BPIN | 2015000030051 |
| Sector | AGROPECUARIO |
| Valor Total | 4.389.347.160 |
| Solicitud de recursos del SGR | 3.411.860.400 |
| Otras fuentes (discriminar) | 977.486.760 OTROS |
| Tiempo de ejecución | |
| Entidad pública designada como ejecutora | GOBERNACION DEL VALLE |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | GOBERNACION DEL VALLE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 58.3 |
| Estado de ejecución Física (Gesproy) | SIN CONTRATAR (dic 15 de 2016) |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR (dic 15 de 2016) |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 040 Ago. 19 de 2016 |
| Impacto | El proyecto está orientado a realizar un Acompañamiento técnico Productivo Ambiental y Socioempresarial durante 12 meses, a 360 productores piscícolas del Departamento del Valle del Cauca, localizados en los Municipios de Candelaria, Florida, Ginebra, Jamundí, Palmira, Guadalajara De Buga, Sevilla Y Calima Darién, mediante la implementación de las Buenas Prácticas de Producción Acuícola (BPPA), |
| Pertinencia | Es pertinente, conveniente y oportuno porque con el fin de fortalecer la producción piscícola, con la producción de Tilapia roja (Oreochromis sp) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) el departamento busca ser más competitivo a nivel nacional e internacional, a través del aprovechamiento |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

| | |
|--|--|
| | de los recursos hídrico y biológico sin ocasionar la desprotección de los mismos |
|--|--|

Proyecto 3:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|--|
| Nombre del Proyecto | REHABILITACIÓN DE LA VIA LA UNIÓN - LA VICTORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DESDE EL K3+140 AL K7+035, TRAMO 2 ETAPA 1, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. |
| Código BPIN | 2015000030067 |
| Sector | TRANSPORTE |
| Valor Total | 7.379.919.885 |
| Solicitud de recursos del SGR | 7.379.919.885 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 6 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | GOBERNACION DEL VALLE |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | GOBERNACION DEL VALLE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 45.9 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 40 de agosto 19 de 2016 |
| Impacto | El impacto de este proyecto se ve reflejado en que la mejoría de esta vía contribuirá con el dinamismo económico de la región cuya base es la comercialización de productos través del transporte terrestre. También el impacto se ve reflejado en el número de Kilómetros pavimentados de vías secundarias indicador fundamental del Plan de Desarrollo del Departamento. |
| Pertinencia | Es pertinente con el plan de desarrollo del Departamento del Valle, este proyecto se encuentra dentro de los Programas de infraestructura. El proyecto contribuye a la recuperación, económica, social y ambiental de la región. |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Proyecto 4:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|--|
| Nombre del Proyecto | APLICACIÓN DE UN MODELO DE GESTION INNOVADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA |
| Código BPIN | 2015000030065 |
| Sector | TRANSPORTE |
| Valor Total | 13.931.000.000 |
| Solicitud de recursos del SGR | 13.931.000.000 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 9 meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DEL VALLE |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | DEPARTAMENTO DEL VALLE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 46.5 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 45 de nov 9 de 2016 |
| Impacto | <p>El Impacto que se logra con este proyecto está representado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se lograr disminuir los tiempos de recorrido en las vías en un 50% • Se logra mejorar infraestructura vial, dinamizar estructuralmente la economía Vallecaucana e impulsar la productividad y competitividad del Departamento aprovechando los procesos de Integración • Se logra mejorar la competitividad de la región <p>Se logra mantener y mejorar un total de 486,46 km de vías rurales en los municipios de: Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, El Águila, El Cairo, La Unión, Obando, Sevilla, Toro, Vijes, Versalles.</p> |
| Pertinencia | El proyecto es pertinente, conveniente y oportuno porque aporta al cumplimiento de |

| | |
|--|---|
| | <p>una de las metas del Plan de Desarrollo Departamental el cual hace énfasis en promover el mejoramiento de la infraestructura vial, dinamizar estructuralmente la economía Vallecaucana e impulsar la productividad y competitividad del Departamento aprovechando los procesos de integración regional, de igual manera el proyecto apunta al mejoramiento de la malla vial de las vías rurales del occidente del Valle del Cauca municipios de: Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, El Águila, El Cairo, La Unión, Obando, Sevilla, Toro, Vijes, Versalles. lo cual mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona, debido a la reactivación económica generada por el aumento del turismo, disminución de los costos de operación de los vehículos, disminución de la accidentalidad y aumento de la seguridad en la zona.</p> |
|--|---|

Proyecto 5:

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|--|---|
| Nombre del Proyecto | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA MEDIANTE METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BASICAS |
| Código BPIN | 2016000030002 |
| Sector | EDUCACION |
| Valor Total | 5.640.321.066 |
| Solicitud de recursos del SGR | 5.640.321.066 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 15 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | CORPOVALLE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 45.9 |
| Estado de ejecución Física (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 23016 |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |

| | |
|--|--|
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 45 de nov 9 de 2016 |
| Impacto | <p>El Impacto que se logra con este proyecto está representado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Nivel nacional esta articulado con el Plan Nacional de Desarrollo buscando la educación de docentes que participan en programas de fortalecimiento en competencias pedagógicas e investigativas medido por número de docentes y cuya meta es 22.500. <p>A nivel Departamental tiene concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental: 211 Gestión Transparente e integración de sectores en oferta y acceso de bienes y servicios a grupos poblacionales.</p> |
| Pertinencia | <p>Dirigido a mejorar el aprendizaje de los alumnos y apoyar la labor del que hacer pedagógico diario de los Docentes.</p> <p>Aborda los procesos de evaluación y, fundamentalmente el alcance del proyecto va encaminado para beneficiar toda la población estudiantil del departamento del Valle del Cauca.</p> |

Proyecto 6:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|--|
| Nombre del Proyecto | IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LA DISPONIBILIDAD, CONTINGENCIA Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. |
| BPIN | 2016000030004 |
| Sector | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC |
| Valor Total | 4.978.907.500 |
| Solicitud de recursos del SGR | 4.978.907.500 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 12 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. |



Rendición de Cuentas de los OCAD

Versión: 7

| | |
|--|---|
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | DEPARTAMENTO DEL VALLE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 41.5 |
| Estado de ejecución física (Física) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Estado de ejecución financiera (financiera) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | ACUERDO 45 DE NOVIEMBRE 9 DE 2016 |
| Impacto | <p>El impacto de este proyecto se ve reflejado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El proyecto contribuye con la estrategia de fortalecimiento Institucional de las entidades territoriales y relación Nación al solucionar la ineficiente capacidad Institucional y tecnológica que presenta la Gobernación del Valle como entidad territorial a través del apoyo regional recibido de los recursos de Regalías. <p>El Proyecto teniendo como objetivo el implementar la política de ciencia, tecnología e innovación y competitividad contribuye efectivamente con la meta de resultado. Aumentar la población con suscripción a Internet en un 1.87% en el periodo de Gobierno del Plan de Desarrollo El Valle está en voz</p> |
| Pertinencia | Es pertinente, conveniente y oportuno porque el proyecto busca resolver el problema relacionado con una capacidad institucional y tecnológica eficiente para atender la demanda por servicios de la comunidad vallecaucana el cual tiene un impacto a nivel departamental, en el ámbito tanto social como económico, |

Proyecto 7:


| ITEM | DESCRIPCION |
|---------------------|---|
| Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y TECNOLÓGICA, ETAPA I, DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. |
| Código BPIN | 2016000030005 |



Rendición de Cuentas de los OCAD


Versión: 7

| | |
|--|---|
| Sector | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC |
| Valor Total | 10.500.000.000 |
| Solicitud de recursos del SGR | 10.500.000.000 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | No aplica |
| Tiempo de ejecución | 12 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | GOBERNACION DEL VALLE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 44.5 |
| Estado de ejecución Física (Gesproy) | SIN CONTRATAR Dic 15 de 2016 |
| Estado de ejecución financiera (Financiera) | SIN CONTRATAR Dic 15 de 2016 |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | ACUERDO 045 DE NOVIEMBRE 9 DE 2016 |
| Impacto | <p>El impacto de este proyecto se ve reflejado en: El proyecto contribuye con la estrategia de fortalecimiento Institucional de las entidades territoriales y relación Nación al solucionar la ineficiente capacidad Institucional y tecnológica que presenta la Gobernación del Valle como entidad territorial a través del apoyo regional recibido de los recursos de Regalías.</p> <p>El Proyecto contribuye a la modernización de la infraestructura tecnológica de la Gobernación del Valle efectivamente con la meta resultado "Alcanzar un 95% la satisfacción de los usuarios frente a los servicios tecnológicos brindados por el Departamento durante el Periodo de Gobierno del Plan "El Valle está en Vos".</p> |
| Pertinencia | <p>Permite Modernizar la plataforma de comunicación integrada, Renovar los equipos de procesamiento electrónico de datos que soportan la gestión administrativa de la Gobernación del Valle, Mejorar la eficiencia y efectividad de las soluciones TIC a través de la implementación de un marco de arquitectura empresarial</p> |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|


Proyecto 8:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|---|
| Nombre del Proyecto | FORMACIÓN EN INGLES "GO VALLE BILINGUAL CITIES" PALMIRA, BUGA, BUENAVENTURA, CARTAGO, TULUA. |
| BPIN | 2016000030007 |
| Sector | EDUCACION |
| Valor Total | 5.000.000.000 |
| Solicitud de recursos del SGR | 5.000.000.000 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 17 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DEL VALLE |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | CORPOVALLE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 37.4 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 45 de nov 9 de 2016 |
| Impacto | El impacto de este proyecto se ve reflejado en: Se encuentra en concordancia con el programa Colombia Bilingüe 2014-2018” del Ministerio de Educación Nacional que se ha propuesta subir la meta para el año 2018 en el nivel de Inglés de los estudiantes del grado 11 en Pre Intermedio B1 del 2% al 8% y del 7% al 35% a los estudiantes que están en nivel básico A2. |
| Pertinencia | Promoción y Difusión del programa, acerca a rectores, padres de familia, estudiantes, docentes, Realización de la prueba de entrada para verificar el nivel de los estudiantes en idioma inglés, para mejorar su conocimiento. |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Proyecto 9:

| ITEM | DESCRIPCION |
|--|---|
| Nombre del Proyecto | APOYO A SEMILLEROS DEPORTIVOS PARA LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA |
| Código BPIN | 2016000030008 |
| Sector | DEPORTE Y RECREACION |
| Valor Total | 9.358.328.929 |
| Solicitud de recursos del SGR | 9.358.328.929 FCR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 16 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | INDERVALLE |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | INDERVALLE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 62.5 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 46 de dic 19 de 2016 |
| Impacto | <p>El impacto de este proyecto se ve reflejado en: Se encuentra en concordancia con la deducción de la violencia y la participación de las personas en los proyectos del estado a 16.200 participantes.</p> <p>Participación de programas con enfoque diferencial, equidad de género y semilleros deportivos en 41 Municipios.</p> <p>Fomento y promoción del deporte comunitario en las comunas de cada municipio.</p> |
| Pertinencia | <p>Estrategia de dotación del Proyecto de Iniciación, Formación Deportiva. Dotación de implementos deportivos para niños y niñas, Estrategia de Formación Deportiva. Formación, desarrollo y habilidades motrices en las disciplinas deportivas seleccionadas.</p> |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Proyecto 10:

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|--|---|
| Nombre del Proyecto | CONSTRUCCIÓN CANCHAS SINTETICAS Y DOTACIÓN DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES EN ONCE MUNICIPIOS DEL, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE |
| BPIN | 2016000030003 |
| Sector | DEPORTE Y RECREACION |
| Valor Total | 2.892.927.806 |
| Solicitud de recursos del SGR | 2.892.927.806 FDR |
| Otras fuentes (discriminar) | NO APLICA |
| Tiempo de ejecución | 8 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | INDERVALLE |
| Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión. | INDERVALLE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 48.2 |
| Estado de ejecución física (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Estado de ejecución financiera (Gesproy) | SIN CONTRATAR dic 15 de 2016 |
| Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 46 de dic 19 de 2016 |
| Impacto | <p>El impacto de este proyecto se ve reflejado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuye al mejoramiento de la infraestructura deportiva. <p>Contribuye al cumplimiento de la meta que busca en el periodo de gobierno aumentar los espacios dedicados a la práctica del deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.</p> |
| Pertinencia | <p>Infraestructura deportiva, destinada al aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y la práctica de deportes en Los municipios contemplados. La dotación de gimnasios biosaludables contempla el diseño de un espacio con una distribución determinada que permita el acceso a todas y cada una de las personas.</p> |

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (*cuando aplique).

El párrafo 1 del artículo 34 de la ley 1530 establece que del total de los recursos designados para financiar proyectos de impacto local, se destinará un porcentaje hasta del 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las Comunidades Negras, Afro Descendientes, Raizales y Palanqueras y hasta otro 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades Indígenas.


Para el segundo semestre del año 2016 el OCAD Pacífico NO aprobó proyectos de Inversión con enfoque diferencial.

OTRAS DECISIONES

Se realizaron sesiones del OCAD para aprobar otras decisiones en el período julio 1° de 2016 a diciembre 31 de 2016. (Ajustes, certificados de cumplimiento de requisitos de ejecución, cierre de proyectos y aprobación de vigencias futuras de ejecución.)

**AJUSTES: 17
DEPARTAMENTO DEL CAUCA NUEVE (9)**
Ajuste 1:

| ITEM | Descripción | | |
|---|---|---------------------------|-----------------|
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN EN DOSCIENTOS METROS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE LOPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA : LÓPEZ, CAUCA, OCCIDENTE | | |
| Código BPIN | 2013000030062 | | |
| Valor total del proyecto | \$3.582.985.167 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto, modificando las fuentes de financiación SGR, así: \$775.276.873 FDR 2015 (acuerdo 040) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | \$775.276.873 | \$775.276.873 |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$2.807.708.294 | | \$2.807.708.294 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$2.807.708.294 | \$775.276.873 | \$3.582.985.167 |


| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Ajuste 2:

| ITEM | Descripción | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CORREDOR DEPORTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA SUBREGION CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| Código BPIN | 2013000030153 | | |
| Valor total del proyecto | \$3.399.125.588 | | |
| Tipo de ajuste | Redistribución de actividades e Incremento en el valor total del proyecto, modificando las fuentes de financiación SGR, así: \$973.903.603 FDR 2015 (acuerdo 040) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | \$973.903.603 | \$973.903.603 |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$2.425.221.985 | | \$2.425.221.985 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$2.425.221.985 | \$973.903.603 | \$3.399.125.588 |

Ajuste 3:

| ITEM | Descripción | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZACION DE LA PUERTA DE ORO DEL ORIENTE PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| Código BPIN | 2013000030060 | | |
| Valor total del proyecto | \$2.683.010.023 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto en \$718.300.416 FDR – 2015 (acuerdo 040) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | \$718.300.416 | \$718.300.416 |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$1.570.637.331 | | \$1.570.637.331 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | \$394.072.276 | | \$394.072.276 |
| TOTAL | \$1.964.709.607 | \$718.300.416 | \$2.683.010.023 |


| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Ajuste 4:

| ITEM | Descripción | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL UNO (1) PIAMONTE, CAUCA, OCCIDENTE | | |
| Código BPIN | 2013000030065 | | |
| Valor total del proyecto | \$6.988.213.953 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto en \$1.330.152.770= FDR 2015 (acuerdo 040) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | \$1.330.152.770 | \$1.330.152.770 |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$4.777.861.183 | | \$4.777.861.183 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | \$880.200.000 | | \$880.200.000 |
| TOTAL | \$5.658.061.183 | \$1.330.152.770 | \$6.988.213.953 |

Ajuste 5:

| ITEM | Descripción | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA DOBLE CALZADA 53 NORTE DESDE LA VARIANTE HACIA LA CARRERA 9 ENTRE EL PR K1+420 HACIA EL P K1+100 EN LA CIUDAD DE POPAYAN PARA AUMENTAR LA INTEGRACION Y COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| Código BPIN | 2014000030044 | | |
| Valor total del proyecto | \$2.699.416.106 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto en \$299.415.949 FCR (acuerdo 040) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$2.000.000.157 | \$299.415.949 | \$2.299.416.106 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | \$400.000.000 | | \$ 400.000.000 |
| TOTAL | \$2.400.000.157 | \$299.415.949 | \$2.699.416.106 |


| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Ajuste 6:

| ITEM | Descripción | | |
|---|--|---------------------------|------------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA 25ACC01 HIGUERONES - FLORENCIA ENTRE EL PR0+850 Y EL PR7+700 MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAUCA, OCCIDENTE | | |
| Código BPIN | 2014000030009 | | |
| Valor total del proyecto | \$15.232.376.203 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto en \$905.350.386 FCR (acuerdo 040) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$14.327.025.817 | \$905.350.386 | \$15.232.376.203 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$14.327.025.817 | \$905.350.386 | \$15.232.376.203 |

Ajuste 7:

| ITEM | Descripción | | |
|---|--|---------------------------|------------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN , REHABILITACIÓN O DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE EN POPAYÁN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| Código BPIN | 2014000030051 | | |
| Valor total del proyecto | \$21.930.036.134 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto en: \$3.654.850.521 FDR 2016 (acuerdo 046) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | \$3.654.850.521 | \$3.654.850.521 |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$18.275.185.613 | | \$18.275.185.613 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$18.275.185.613 | \$3.654.850.521 | \$21.930.036.134 |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Ajuste 8:

| ITEM | Descripción | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nombre del proyecto | FORTALECIMIENTO DE LA AGROCADENA DEL AGUACATE HASS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE ACOPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| Código BPIN | 2014000030040 | | |
| Valor total del proyecto | \$4.557.601.417 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el Vr total del proyecto en \$901.768.515=, así: \$727.768.515= FCR 2016 y \$174.000.000= Rec. Propios (acuerdo 046) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | \$2.800.000.000 | | \$2.800.000.000 |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$65.345.402 | \$727.768.515 | \$793.113.917 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | \$790.487.499 | \$174.000.000 | \$954.487.499 |
| TOTAL | \$3.655.832.901 | \$901.768.515 | \$4.557.601.416 |

Ajuste 9:

| ITEM | Descripción | | |
|--|--|---------------------------|---------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CAQUETA, VEREDA LA AGENCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, CAUCA, OCCIDENTE | | |
| Código BPIN | 2014000030088 | | |
| Valor total del proyecto | \$704.727.329 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto en: \$117.155.473 FCR 2016 (acuerdo 046) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$547.571.856 | \$117.155.473 | \$664.727.329 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | \$40.000.000 | | \$40.000.000 |
| TOTAL | \$587.571.856 | \$117.155.473 | \$704.727.329 |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|


DEPARTAMENTO DE CHOCÓ: TRES (3) AJUSTES APROBADOS

Ajuste 10:

| ITEM | Descripción | | |
|---|---|---------------------------|------------------|
| Nombre del proyecto | RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL Y CONEXIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE 4KM DE LA VÍA SAN JOSÉ DEL PALMAR – CHOCÓ | | |
| Código BPIN | 2014000030015 | | |
| Valor total del proyecto | \$12.945.930.073 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto en \$3.918.290.257= FCR 2015 (acuerdo 040) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$9.027.639.816 | \$3.918.290.257 | \$12.945.930.073 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$9.027.639.816 | \$3.918.290.257 | \$12.945.930.073 |

Ajuste 11:

| ITEM | Descripción | | |
|---|---|---------------------------|------------------|
| Nombre del proyecto | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AEROPUERTOS DE LA COSTA PACÍFICA - PISTA DE ATERRIZAJE DE PIZARRO BAJO BAUDÓ SUBREGIÓN PACIFICO SUR – CHOCÓ | | |
| Código BPIN | 2013000030190 | | |
| Valor total del proyecto | \$10.879.681.761 | | |
| Tipo de ajuste | Modificación en las fuentes de financiación, Incremento en el valor total del proyecto en \$2.517.230.447= FDR 2016 (acuerdo 040) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | \$8.362.451.314 | \$2.517.230.447 | \$10.879.681.761 |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | | | |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$8.362.451.314 | \$2.517.230.447 | \$10.879.681.761 |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|


Ajuste 12:

| ITEM | Descripción | | |
|--|---|---------------------------|------------------|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA PRO + 000 RUTA 6002, PUENTE LA PLATINA, A LA ENTRADA DEL BARRIO PORVENIR QUIBDÓ, CHOCÓ OCCIDENTE | | |
| Código BPIN | 2013000030114 | | |
| Valor total del proyecto | \$17.654.687.169 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el Valor total del proyecto en \$2.807.612.722 del FDR 2015-2016. (Acuerdo 046) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | \$8.934.285.847 | \$2.807.612.722 | \$11.741.898.569 |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$5.812.788.600 | | \$ 5.812.788.600 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | \$100.000.000 | | \$ 100.000.000 |
| TOTAL | \$14.847.074.447 | \$2.807.612.722 | \$17.654.687.169 |

DEPARTAMENTO DE NARIÑO: CINCO (5) AJUSTES APROBADOS

Ajuste 13:

| ITEM | Descripción | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|
| Nombre del proyecto | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE LEIVA Y EL ROSARIO SUBREGION CORDILLERA A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | |
| Código BPIN | 2015000030006 | | |
| Valor total del proyecto | \$1.134.920.000 | | |
| Tipo de ajuste | Modificación en las fuentes de financiación, con lo cual el proyecto se disminuye en \$1.748.450.266, correspondiente a operación y mantenimiento del Municipio de Leyva. (acuerdo 040) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$1.134.920.000 | | \$1.134.920.000 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | \$1.748.450.266 | - \$1.748.450.266 | |
| TOTAL | \$2.883.370.266 | - \$1.748.450.266 | \$1.134.920.000 |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

Ajuste 14:

| ITEM | Descripción | | |
|---|---|---------------------------|-----------------|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | |
| Código BPIN | 2013000030038 | | |
| Valor total del proyecto | \$3.488.770.472 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto \$68.770.472 FCR 2016 (acuerdo 040) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$3.420.000.000 | \$68.770.472 | \$3.488.770.472 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$3.420.000.000 | \$68.770.472 | \$3.488.770.472 |

Ajuste 15:

| ITEM | Descripción | | |
|---|--|---------------------------|------------------|
| Nombre del proyecto | REPOSICIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL "EL BUEN SAMARITANO" E.S.E. LA CRUZ, NARIÑO, OCCIDENTE | | |
| Código BPIN | 2012000030072 | | |
| Valor total del proyecto | \$23.733.911.913 | | |
| Tipo de ajuste | Modificación en las fuentes de financiación, pasa de asignaciones directas a FCR : \$1.552.902.764 FCR 2015-2016 (acuerdo 041) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$5.000.000.000 | + \$1.552.902.764 | \$6.552.902.764 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | \$18.733.911.913 | - \$1.552.902.764 | \$17.181.009.149 |
| TOTAL | \$23.733.911.913 | 0 | \$23.733.911.913 |

Ajuste 16:

| ITEM | Descripción | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA PARA LA SUBREGIÓN DEL MAYO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | |
| Código BPIN | 2013000030021 | | |
| Valor total del proyecto | \$3.213.580.693 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto en \$63.580.693 FDR 2015-2016 (Acuerdo 041) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | \$3.150.000.000 | \$63.580.693 | \$3.213.580.693 |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | | | |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$3.150.000.000 | \$63.580.693 | \$3.213.580.693 |

Ajuste 17:

| ITEM | Descripción | | |
|--|--|---------------------------|------------------|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE TANGUA Y PASTO, NARIÑO, OCCIDENTE | | |
| Código BPIN | 2013000030104 | | |
| Valor total del proyecto | \$13.967.664.041 | | |
| Tipo de ajuste | Incremento en el valor total del proyecto: \$1.752.053.334 FCR 2015-2016. (acuerdo 046) | | |
| Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
| Asignaciones directas | | | |
| Fondo de Compensación Regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de Compensación Regional (60%) | \$10.582.966.625 | \$1.752.053.334 | \$12.335.019.959 |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | |
| Incentivo a la producción | | | |
| Otras fuentes | \$1.632.644.082 | | \$1.632.644.082 |
| TOTAL | \$12.215.610.707 | \$1.752.053.334 | \$13.967.664.041 |

Relación de proyectos con fecha de expedición del certificado de cumplimiento de requisitos previos al acto administrativo.

| Sector | Fase | BPIN | Proyecto | Valor Total Proyecto | Valor Aprobado Regalías | FONDO DE APROBACION | | Ejecutor Designado | Instancia que adelanta la Contratación de la Interventoría | Fecha Sesion | Numero de acta | Numero de Acuerdo | fecha de Expedicion Acuerdo | Expedicion del Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Ejecucion | Fecha de Expedicion del Certificado |
|--|------|---------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-----|---|--|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | FCR | FDR | | | | | | | | |
| AGROPECUARIO | 3 | 2014000030046 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL PLATANO PARA 278 PRODUCTORES EN MARCO DEL CONTRATO PLAN ATRATO GRAN DARIÉN, CHOCÓ, OCCIDENTE. | \$ 1.253.009.662 | \$ 1.253.009.662 | \$ 1.253.009.662 | | DEPARTAMENTO DE CHOCÓ NIT. 891.680.010-3 | DEPARTAMENTO DE CHOCÓ NIT. 891.680.010-3 | Jul. 19 de 2016 | 35 | 40 | Ago 19 de 2016 | SI | Sept 14 de 2016 |
| AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3 | 2016000030022 | IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN, RIOSUCIO, UNGUÍA, Y ACANDÍ, CHOCÓ, OCCIDENTE. | \$ 6.999.441.400 | \$ 6.841.941.400 | \$ 6.841.941.400 | | DEPARTAMENTO DE CHOCÓ NIT. 891.680.010-3 | DEPARTAMENTO DE CHOCÓ NIT. 891.680.010-3 | Nov 2 de 2016 | 38 | 45 | Nov 9 de 2016 | SI | Dic 16 de 2016 |
| SALUD | 3 | 2015000030037 | DOTACIÓN DE CINCO (5) CENTRO DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE ATRATO, CÉRTEGUIL, RIO IRO, MEDIO BAUDÓ Y UNIÓN PANAMERICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, OCCIDENTE | \$ 3.746.347.400 | \$ 3.746.347.400 | \$ 3.746.347.400 | | DEPARTAMENTO DE CHOCÓ NIT. 891.680.010-3 | DEPARTAMENTO DE CHOCÓ NIT. 891.680.010-3 | Nov 2 de 2016 | 38 | 45 | Nov 9 de 2016 | SI | Nov 23 de 2016 |
| EDUCACION | 3 | 2016000030017 | FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN EL DEPARTAMENTO NARIÑO. | \$ 7.727.719.961 | \$ 7.727.719.961 | \$ 7.727.719.961 | | DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT. 800.103.923-8 | DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT. 800.103.923-8 | Nov 2 de 2016 | 38 | 45 | Nov 9 de 2016 | SI | Nov. 15 de 2016 |
| OTROS SECTORES | 3 | 2015000030034 | ACTUALIZACIÓN , MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL VALLE DEL CAUCA. | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | | IMPRENTA DEPARTAMENTAL NIT. | GOBER. DEL VALLE, NIT: 890399029-5 | Jul. 29 de 2016 | 35 | 40 | Ago 19 de 2016 | SI | Sept 23 de 2016 |
| AGROPECUARIO | 3 | 2015000030051 | IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS PRODUCTIVAS ACUICOLAS EN EL CULTIVO DE LAS ESPECIES TILAPIA ROJA OREOCHROMIS SP Y TRUCHA ARCO IRIS ONCORHYNCHUS MYKISS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA | 4.389.347.160 | 3.411.860.400 | 3.411.860.400 | | GOBER. DEL VALLE, NIT: 890399029-5 | GOBER. DEL VALLE, NIT: 890399029-5 | Jul. 29 de 2016 | 35 | 40 | Ago 19 de 2016 | | |
| TRANSPORTE | 3 | 2015000030067 | REHABILITACIÓN DE LA VÍA LA UNIÓN - LA VICTORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DESDE EL K3+140 AL K7+035, TRAMO 2 ETAPA 1, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 7.379.919.885 | 7.379.919.885 | 7.379.919.885 | | GOBER. DEL VALLE, NIT: 890399029-5 | GOBER. DEL VALLE, NIT: 890399029-5 | Jul. 29 de 2016 | 35 | 40 | Ago 19 de 2016 | SI | Sept. 14 de 2016 |
| TRANSPORTE | 3 | 2015000030065 | APLICACIÓN DE UN MODELO DE GESTION INNOVADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 13.931.000.000 | 13.931.000.000 | 13.931.000.000 | | DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA NIT. 890.399.029-5 | DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA NIT. 890.399.029-5 | Nov 2 de 2016 | 38 | 45 | Nov 9 de 2016 | SI | Dic 29 de 2016 |
| EDUCACION | 3 | 2016000030002 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA MEDIANTE METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BASICAS | 5.640.321.066 | 5.640.321.066 | 5.640.321.066 | | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE NIT: 800187151-9 | CORPOVALLE NIT: 800182554-0 | Nov 2 de 2016 | 38 | 45 | Nov 9 de 2016 | SI | Dic 15 de 2016 |
| TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC | 3 | 2016000030004 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LA DISPONIBILIDAD, CONTINGENCIA Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | 4.978.907.500 | 4.978.907.500 | 4.978.907.500 | | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. NIT: 800135729-2 | DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA NIT. 890.399.029-5 | Nov 2 de 2016 | 38 | 45 | Nov 9 de 2016 | SI | Dic 15 de 2016 |

Cierre de Proyectos:

CAUCA

| BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO | VALOR APROBADO SGR | VALOR SALDO DE DEVOLUCIÓN | EJECUTOR DESIGNADO | Instancia que contrató la interventoría | OBSERVACIÓN |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---|--|
| 2013000030196 | ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA LOGISTICA ESPECIALIZADA-ILE-EN LA SUB-REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 690.595.900 | 690.595.900 | 1.395.347 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | Resolución 04082-06-2016 de cierre de proyecto Jun/28/2016 |
| 2013000030027 | ATENCIÓN DE (5) CINCO SITIOS CRÍTICOS 25CC21 LA VÍA PESCADOR - SIBERIA, CALDONO PR 0+444, PR1 + 262, PR1 + 693, PR4+500 DE LA RED VIAL SECUNDARIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 699.704.131 | 699.704.131 | 11.291.919 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | Resolución 01303-03-2016 de cierre de proyecto Mar/07/2016 |
| 2013000030025 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ENTRE PR1 + 260 Y PR2 + 041 DE LA VÍA 31CC02 CORINTO-PADILLA - PUERTO TEJADA | 1.064.040.878 | 1.034.329.220 | 17.538 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | Resolución 01302-03-2016 cierre de proyecto Mar/07/2016 |
| 2012000030057 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE LA VÍA 25CC16 LA VENTA - LA CAPILLA - LA PRIMAVERA, ENTRE EL PR 0+000 AL PR 0+700, MUNICIPIO CAJIBÍO, CAUCA, OCCIDENTE | 1.296.034.058 | 1.283.544.536 | 2.883 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | Resolución 01477-03-2016 cierre de proyecto Mar 16/2016 |

Cierre de Proyectos:


NARIÑO

| BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR APROBADO DEL PROYECTO | VALOR SALDO DE DEVOLUCIÓN | EJECUTOR DESIGNADO | INSTANCIA QUE CONTRATA INTERVENTORÍA | OBSERVACIONES |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 2013000030092 | MEJORAMIENTO DE VÍAS DE EVACUACIÓN PASO NACIONAL MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | \$1.300.000.000 | \$600.000.000 | \$0 | MUNICIPIO DE NARIÑO | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Resolución No.069 del 11 de Mayo de 2016. Cierre de proyecto cofinanciado con recursos del SGR |

Cierre de Proyectos:

VALLE DEL CAUCA

| BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO | VALOR APROBADO SGR | VALOR SALDO DE DEVOLUCION | EJECUTOR DESIGNADO | ENTIDAD QUE CONTRATO INTERVENTORIA | N° RESOLUCION DE CIERRE |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------|
| 2012000030092 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA TULLUA-RIOFRIO-TRUJILLO Y RIOFRIO Y LOS CORREGIMIENTOS DE SALONICA Y FENICIA, VALLE DEL CAUCA | \$ 858.197.000 | \$ 858.197.000 | \$ 687.532 | DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT 890399029-5 | DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT 890399029-5 | 010-61-0505 DEL 14-SEP - 2016 |
| 2013000030063 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES PARA REDUCIR EL RIESGO, PREVENIR Y ATENDER EMERGENCIAS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | \$ 15.145.928.668 | \$ 14.910.643.268 | \$ 6.492.312 | DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT 890399029-5 | SUPERVISION SIN COSTO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT 890399029-5 | 010-61-0506 DEL 14-SEP- 2016 |
| BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO | VALOR APROBADO SGR | VALOR SALDO DE DEVOLUCION | EJECUTOR DESIGNADO | ENTIDAD QUE CONTRATO INTERVENTORIA | N° RESOLUCION DE CIERRE |
| 2013000030047 | ESTUDIOS DE GESTION PREDIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA DOBLE CALZADA ENTRE MENGUA Y CRUCERO DAPA, ANTIGUA VIA CALI-YUMBO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | \$ 200.000.000 | \$ 200.000.000 | \$ 159.977.197 | DEPARTAMENTO DEL VALLE | DEPARTAMENTO DEL VALLE | 010-61-0599 DE 14-OCT-2016 |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Rendición de Cuentas de los OCAD | Versión: 7 |
|---|---|-------------------|

APROBACION DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCION

Autorizar a los proyectos de inversión a continuación relacionados para recibir el bien o servicio en el Bienio 2017-2018

| ACUERDO No. | CAUCA | CHOCO | NARIÑO | VALLE |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40 | 2014000030089 | | | 2015000030029 |
| 40 | | | | 2014000030049 |
| 40 | | | | 2015000030067 |
| 45 | | 2016000030022 | 2014000030050 | 2015000030065 |
| 45 | | 2015000030037 | 2013000030195 | 2016000030007 |
| 45 | | | 2014000030069 | 2016000030002 |
| 45 | | | | 2016000030004 |
| 45 | | | | 2016000030005 |
| 45 | | | | 2015000030034 |
| 45 | | | | 2015000030051 |
| 46 | 2016000030019 | 2016000030024 | 2015000030006 | 2016000030008 |
| 46 | 2016000030015 | 2015000030069 | 2016000030017 | 2016000030003 |
| 46 | 2016000030020 | | | 2015000030011 |
| 46 | 2014000030041 | | | 2015000030001 |
| 46 | 2014000030063 | | | |
| 46 | 2014000030044 | | | |
| 46 | 2012000030055 | | | |
| 46 | 2014000030021 | | | |
| 46 | 2015000030062 | | | |
| 46 | 2014000030063 | | | |

ANEXOS

Cualquier documento que el OCAD estime conveniente para soportar la información consignada en el presente informe.

Tel: (2)6200000 Ext 3974
e-mail: ocadpacifico@gmail.com
Edificio Palacio de San Francisco - Cali
Gobernación del Valle del Cauca
